

Diagrama de Gantt – Proyecto MapaDoc

Proyecto	Implementación del SGDD MapaDoc y app móvil – Sanatorio Mapaci
Líder de proyecto	Piccoli Nicolás
Fechas del proyecto	29/08/2025 – 05/01/2026
Duración total	87 días hábiles
Tareas	66 (en 9 fases)
Recursos	9

Tareas

ID	Nombre	Pred.	Dur.	Recursos	Inicio	Fin
Fase Inicial			19		29/08/2025	24/09/2025
1	Identificación de stakeholders		5	Analista funcional	29/08/2025	04/09/2025
2	Definición del alcance y objetivos	1	2	Líder de proyecto, Analista funcional	05/09/2025	08/09/2025
3	Estimaciones preliminares de costos	2	7	Líder de proyecto, Analista funcional	09/09/2025	17/09/2025
4	Aprobación del proyecto	3	5	Gerencia	18/09/2025	24/09/2025
Gestión de adquisiciones de software			48		05/09/2025	12/11/2025
5	Análisis del estado actual del software	1	4	Especialista en seguridad, Administrador de...	05/09/2025	10/09/2025
6	Selección de expertos referentes (consultores)	5	2	Líder de proyecto	11/09/2025	12/09/2025
7	Relevamiento de proveedores de software	6	2	Analista funcional	15/09/2025	16/09/2025
8	Determinación de matriz de comparación	7	1	Analista funcional	17/09/2025	17/09/2025
9	Selección de los proveedores a enviar RFP	8	1	Líder de proyecto	18/09/2025	18/09/2025
10	Redacción RFP	8	1	Líder de proyecto	18/09/2025	18/09/2025
11	Envío de RFP a proveedores	4, 9, 10	1	Líder de proyecto	25/09/2025	25/09/2025
12	Recepción de presupuesto y comparaciones	11	7	Analista funcional	26/09/2025	06/10/2025
13	Selección de proveedor y generación y envío de Orden de Compra	12	2	Líder de proyecto	07/10/2025	08/10/2025
14	Negociación y firma del contrato de licenciamiento del SGDD MapaDoc y la app	13	3	Líder de proyecto	09/10/2025	14/10/2025
15	Compra del software SGDD MapaDoc (pago y alta de licencias)	14	2	Líder de proyecto, Analista funcional	15/10/2025	16/10/2025
16	Recepción del software	15	15	Analista funcional	17/10/2025	06/11/2025
17	Controles de recepción	16	4	Analista funcional	07/11/2025	12/11/2025
Gestión de adquisiciones de hardware			33		05/09/2025	22/10/2025
18	Análisis del estado actual de hardware	1	4	Administrador de sistemas de TI	05/09/2025	10/09/2025
19	Selección de expertos referentes (consultores)	18	2	Líder de proyecto	11/09/2025	12/09/2025
20	Relevamiento de proveedores	19	2	Administrador de sistemas de TI	15/09/2025	16/09/2025
21	Determinación de matriz de comparación	20	1	Administrador de sistemas de TI	17/09/2025	17/09/2025
22	Selección de los proveedores a enviar RFP	21	1	Líder de proyecto	18/09/2025	18/09/2025
23	Redacción RFP	21	1	Líder de proyecto	18/09/2025	18/09/2025

En rojo: tareas del camino crítico.

Tareas

ID	Nombre	Pred.	Dur.	Recursos	Inicio	Fin
24	Envío de RFP a proveedores	4, 22, 23	1	Líder de proyecto	25/09/2025	25/09/2025
25	Recepción de presupuesto y comparaciones	24	7	Administrador de sistemas de TI	26/09/2025	06/10/2025
26	Selección de proveedor y generación y envío de Orden de Compra	25	2	Líder de proyecto	07/10/2025	08/10/2025
27	Recepción del hardware	26	7	Administrador de sistemas de TI	09/10/2025	20/10/2025
28	Controles de recepción	27	2	Administrador de sistemas de TI	21/10/2025	22/10/2025
Implementación y configuración			27		23/10/2025	01/12/2025
29	Implementar y configurar el servidor	28	4	Administrador de sistemas de TI	23/10/2025	28/10/2025
30	Instalar el sistema operativo	17, 29	2	Administrador de sistemas de TI	13/11/2025	14/11/2025
31	Instalar antivirus	30	2	Especialista en seguridad, Administrador de...	18/11/2025	19/11/2025
32	Implementar y configurar el SGDD	30	7	Especialista en seguridad, Administrador de...	18/11/2025	26/11/2025
33	Implementar y configurar la app	30	7	Especialista en seguridad, Administrador de...	18/11/2025	26/11/2025
34	Verificar compatibilidades técnicas	31	5	Especialista en Integración	20/11/2025	26/11/2025
35	Migrar la base de datos	34	3	Especialista en seguridad, Administrador de...	27/11/2025	01/12/2025
36	Creación y configuración de roles y permisos	30	5	Especialista en seguridad, Administrador de...	18/11/2025	24/11/2025
Digitalización de HCE en papel			37		23/10/2025	16/12/2025
37	Instalar y configurar el nuevo scanner	28	2	Administrador de sistemas de TI	23/10/2025	24/10/2025
38	Escanear y organizar los documentos a digitalizar	37	3	Personal administrativo	27/10/2025	29/10/2025
39	Carga de documentos al sistema SGDD	36, 38	5	Personal administrativo	25/11/2025	01/12/2025
40	Indexación de las HCE por paciente y fecha	35, 39	10	Especialista en Integración	02/12/2025	16/12/2025
41	Control de calidad de los documentos escaneados	39	3	Personal administrativo	02/12/2025	04/12/2025
42	Eliminación segura de documentos físicos digitalizados	41	2	Personal administrativo	05/12/2025	09/12/2025
Segurización			11		18/11/2025	02/12/2025
43	Segurizar los puertos	31	3	Especialista en seguridad, Administrador de...	20/11/2025	24/11/2025
44	Configurar accesos por VPN	31	3	Especialista en seguridad, Administrador de...	20/11/2025	24/11/2025
45	Definir perfiles de usuario y acceso	36	3	Administrador de sistemas de TI, Especialista...	25/11/2025	27/11/2025
46	Definir y otorgar claves de acceso	31, 36, 45	3	Especialista en seguridad, Administrador de...	28/11/2025	02/12/2025

En rojo: tareas del camino crítico.

Tareas

ID	Nombre	Pred.	Dur.	Recursos	Inicio	Fin
47	Definir políticas de backup y respaldo	30	3	Líder de proyecto, Especialista en seguridad,...	18/11/2025	20/11/2025
48	Definir tiempo de guardado (retención) de las HC digitalizadas	30	1	Líder de proyecto, Especialista en seguridad	18/11/2025	18/11/2025
	Pruebas		24		25/11/2025	30/12/2025
49	Validación de los cambios implementados del sistema operativo	31, 36	7	Analista de Calidad	25/11/2025	03/12/2025
50	Probar permisos de cada rol y validar los correctos accesos y visualizaciones	46	1	Analista de Calidad	03/12/2025	03/12/2025
51	Prueba de estrés del servidor y a la aplicación	50	2	Analista de Calidad	04/12/2025	05/12/2025
52	Analizar los puertos abiertos que utiliza el servidor principal, verificando que...	43	3	Especialista en seguridad	25/11/2025	27/11/2025
53	Prueba de almacenamiento según peso de los archivos	51	1	Analista de Calidad	09/12/2025	09/12/2025
54	Prueba ABM (alta, baja y modificación) del SGDD	53	1	Analista de Calidad	10/12/2025	10/12/2025
55	Prueba ABM (alta, baja y modificación) de la app	54	1	Analista de Calidad	11/12/2025	11/12/2025
56	Prueba de tiempo de guardado, respaldo y restauración	47, 48, 55	1	Analista de Calidad, Administrador de sistemas...	12/12/2025	12/12/2025
57	Prueba de búsqueda de historias clínicas	40	1	Analista de Calidad	17/12/2025	17/12/2025
58	Validación y verificación del correcto funcionamiento del nuevo software implementado	40, 45, 57	2	Analista de Calidad	18/12/2025	19/12/2025
59	Generación de reporte integral de pruebas	49, 51, 52, 56, 58	3	Analista de Calidad	22/12/2025	23/12/2025
60	Corrección de errores	59	4	Especialista en Integración	24/12/2025	30/12/2025
	Capacitación		6		03/12/2025	11/12/2025
61	Definir entrenador	46	1	Líder de proyecto	03/12/2025	03/12/2025
62	Definir fecha y hora del dictado	61	1	Especialista en implementación y capacitación	04/12/2025	04/12/2025
63	Confeccionar material	50, 61	2	Especialista en implementación y capacitación	04/12/2025	05/12/2025
64	Dictar capacitación	62, 63	2	Especialista en implementación y capacitación	09/12/2025	10/12/2025
65	Evaluar los conocimientos	64	1	Especialista en implementación y capacitación	11/12/2025	11/12/2025
	Seguimiento post implementación		3		31/12/2025	05/01/2026
66	Validar el funcionamiento de las aplicaciones en hora pico	42, 47, 60, 65	3	Administrador de sistemas de TI	31/12/2025	05/01/2026

En rojo: tareas del camino crítico.

Diagrama de Gantt



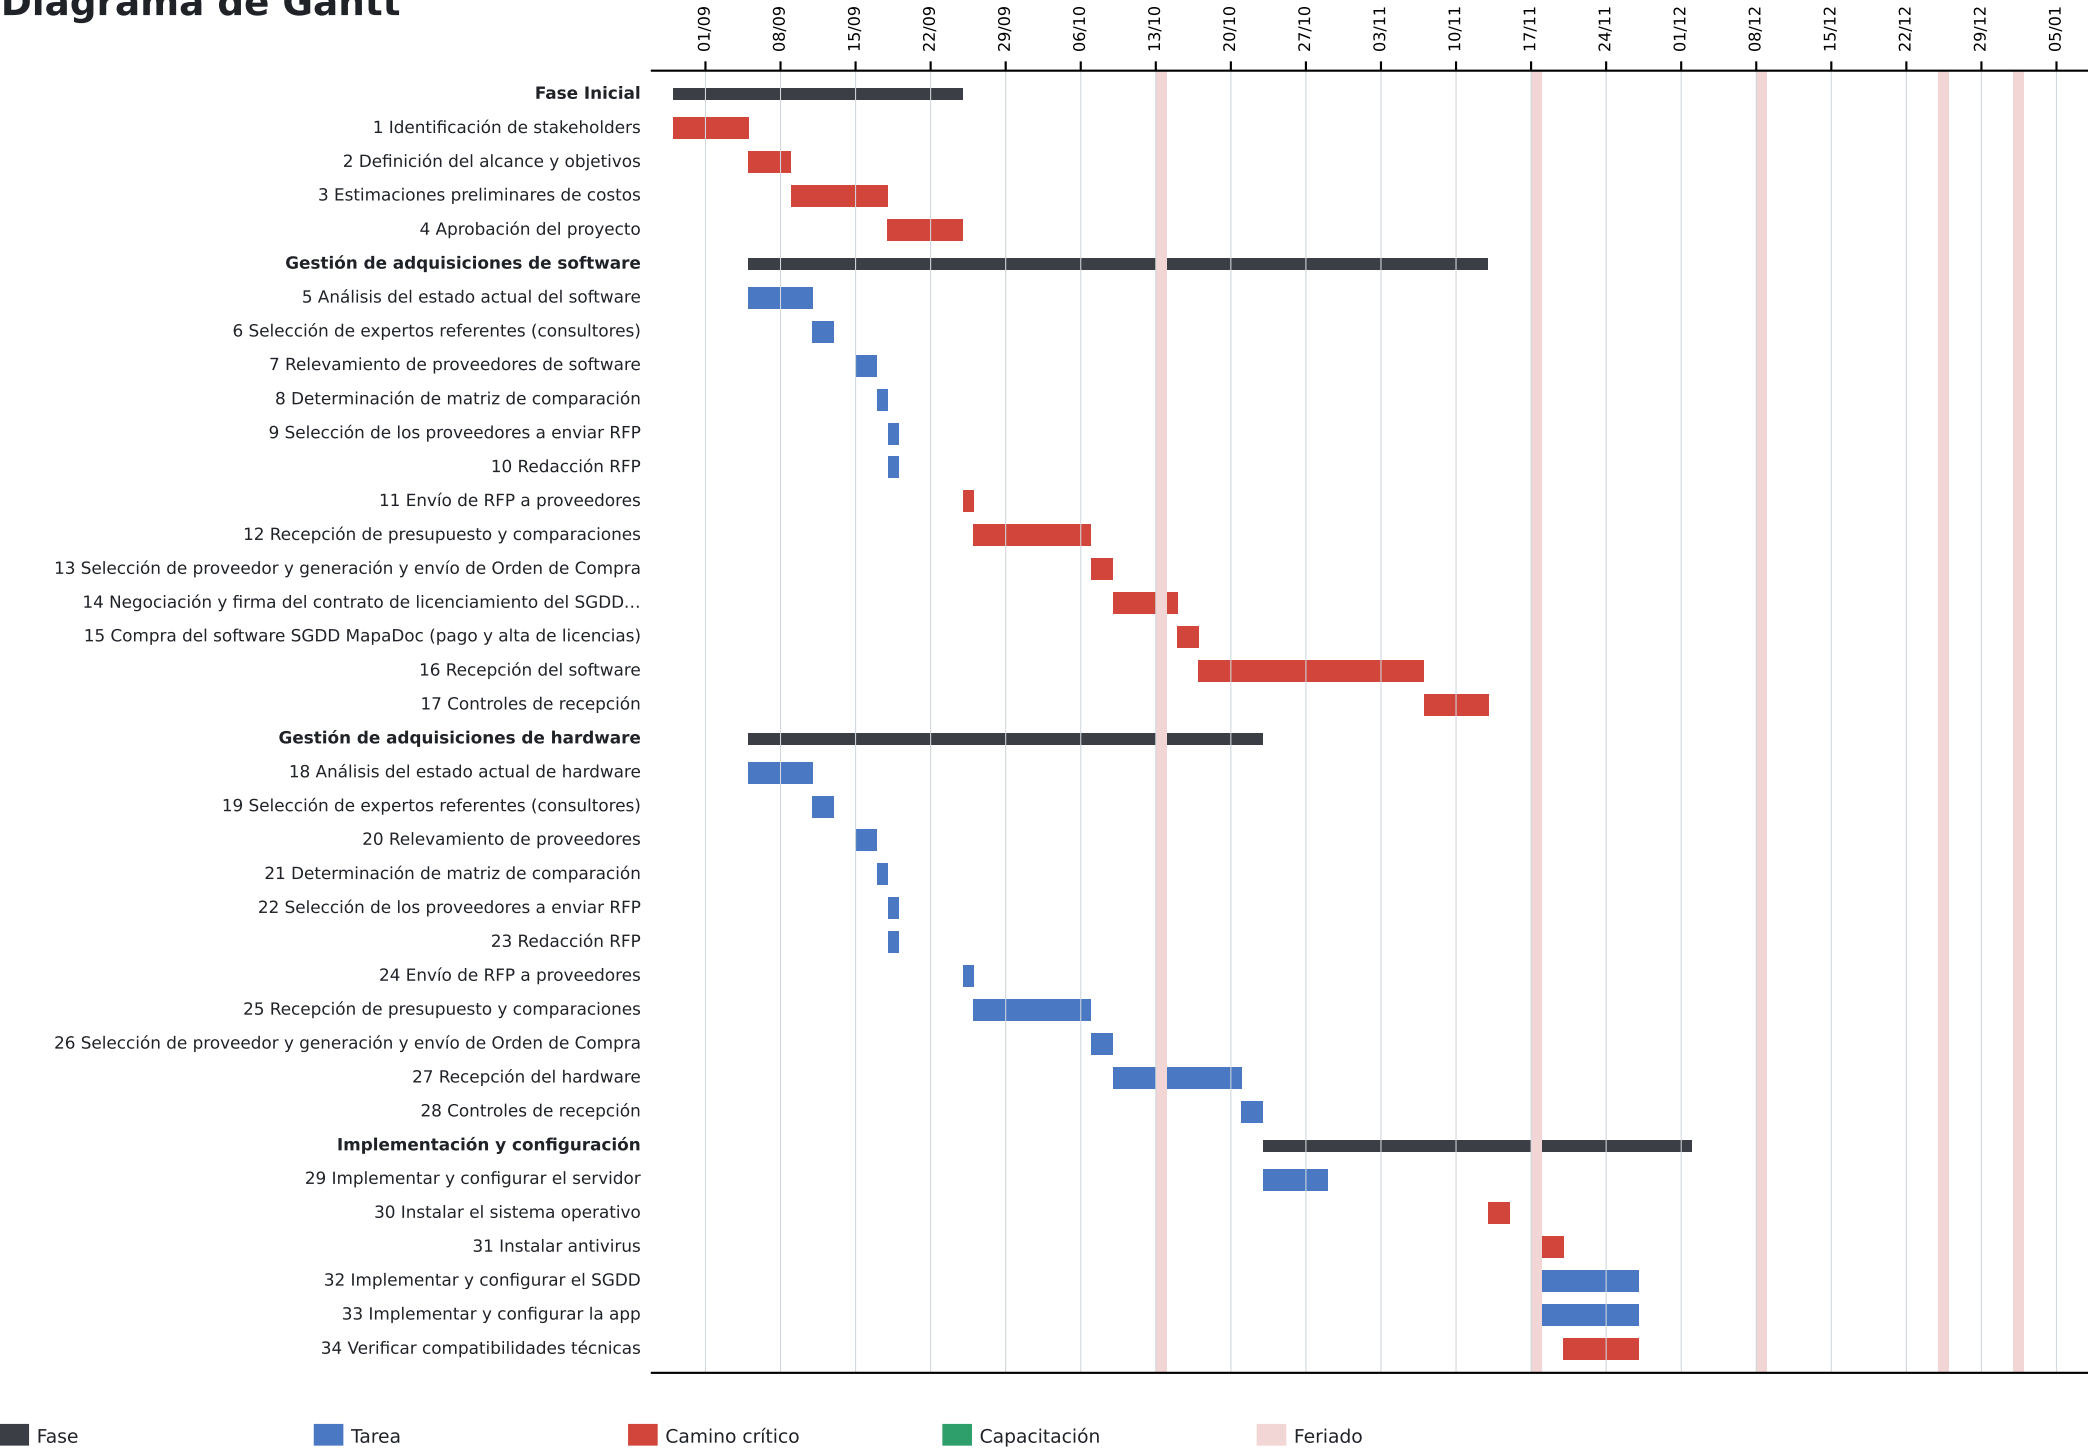


Diagrama de Gantt

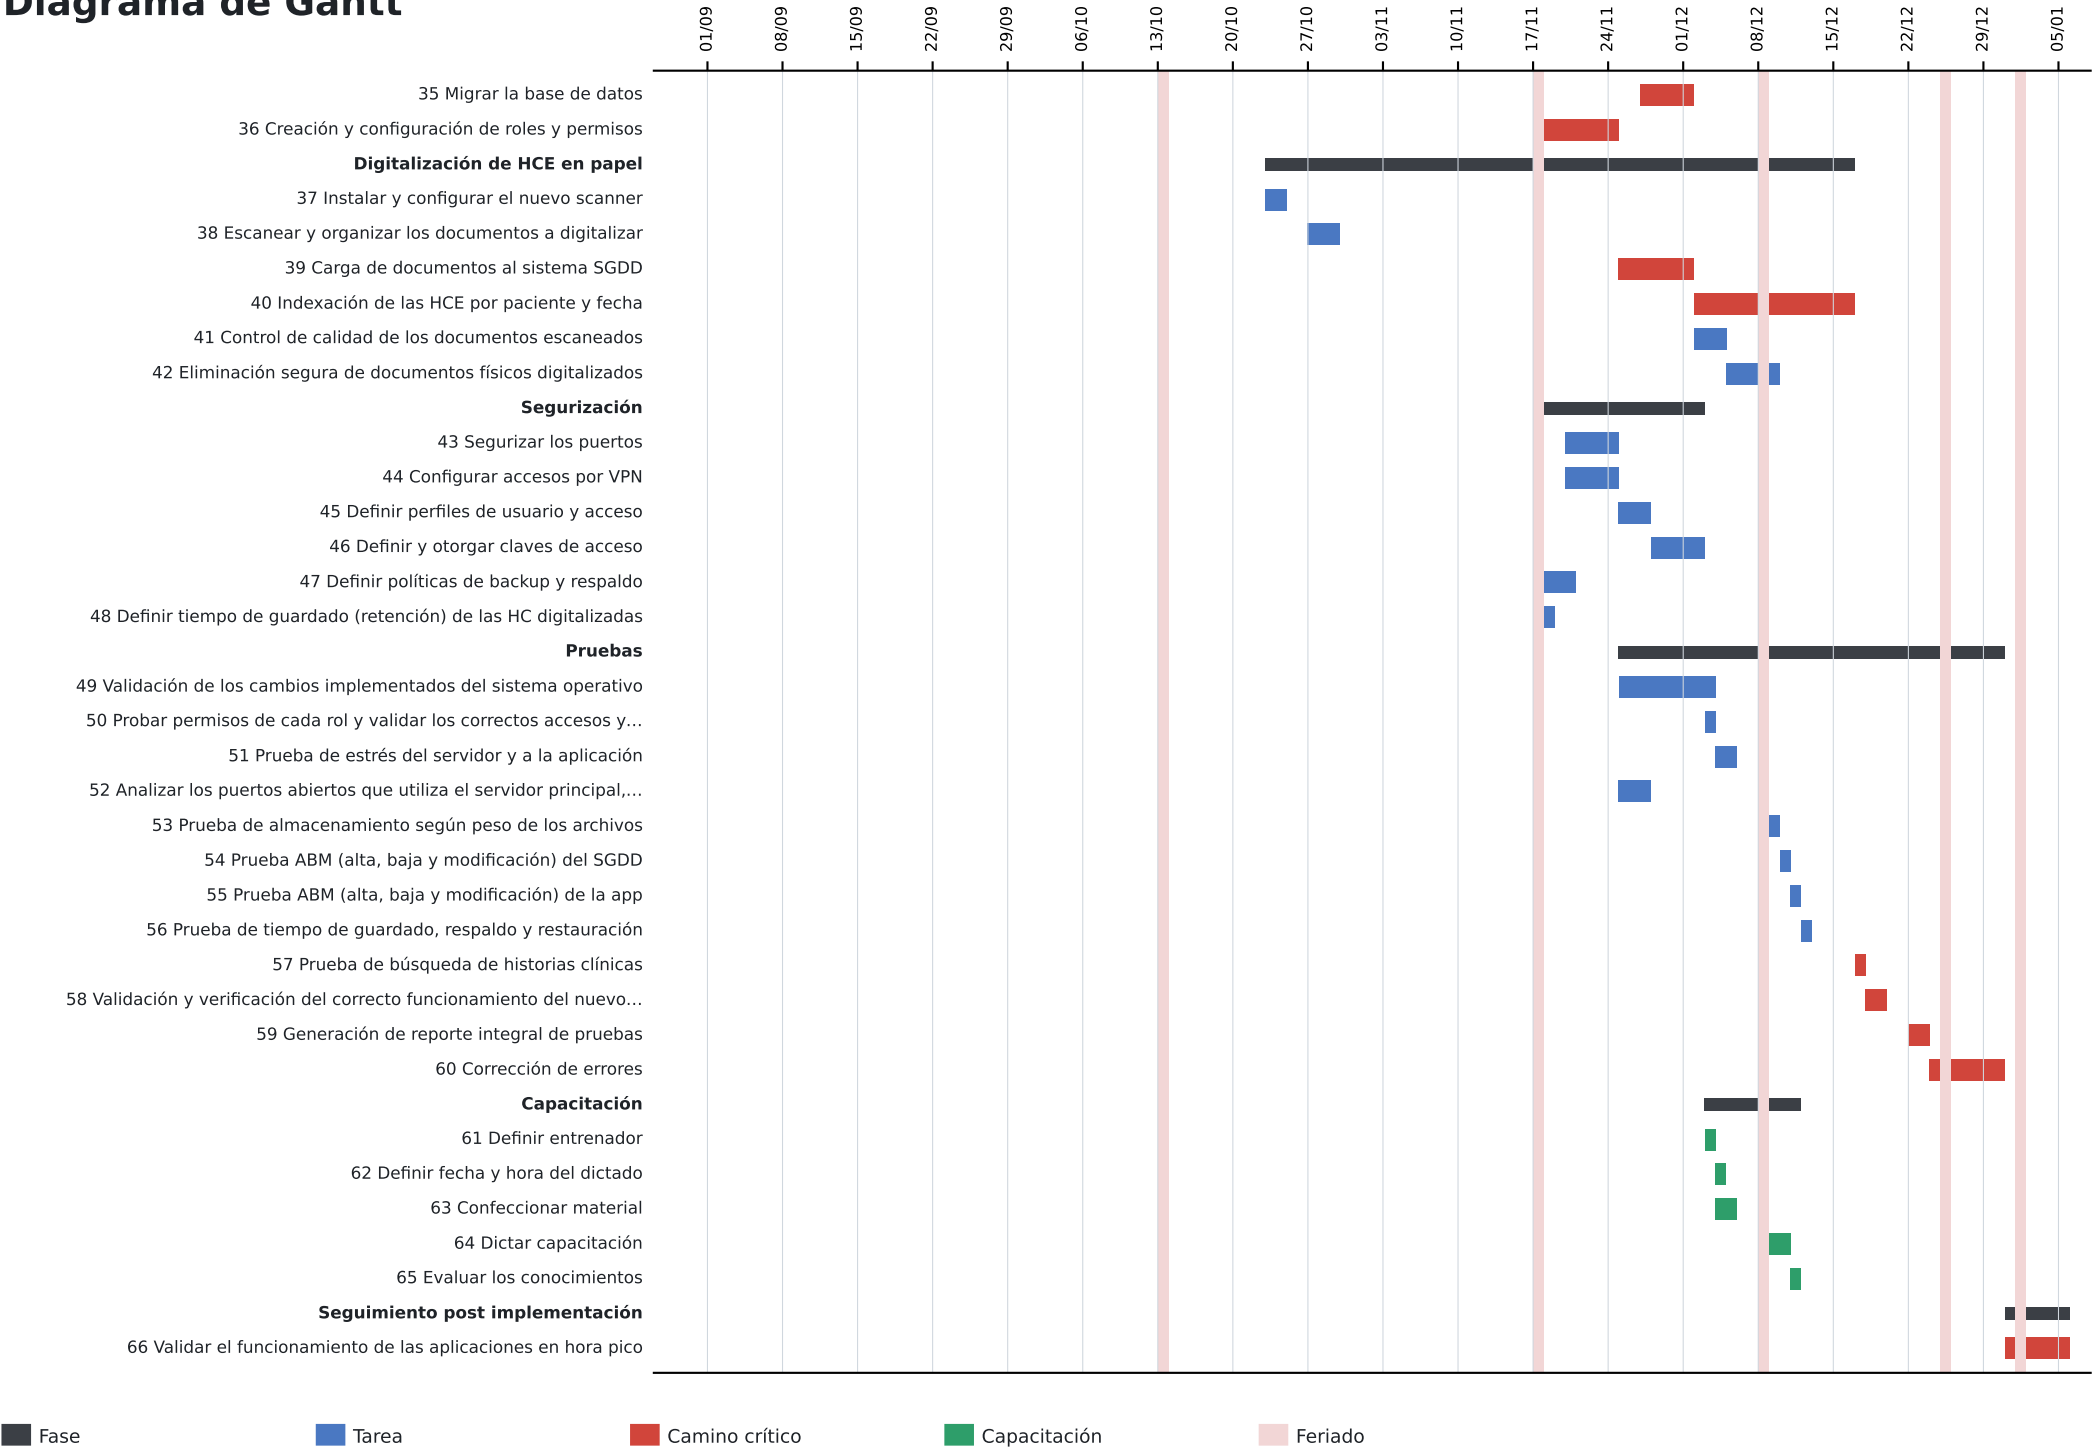

Utilización de recursos (carga semanal)

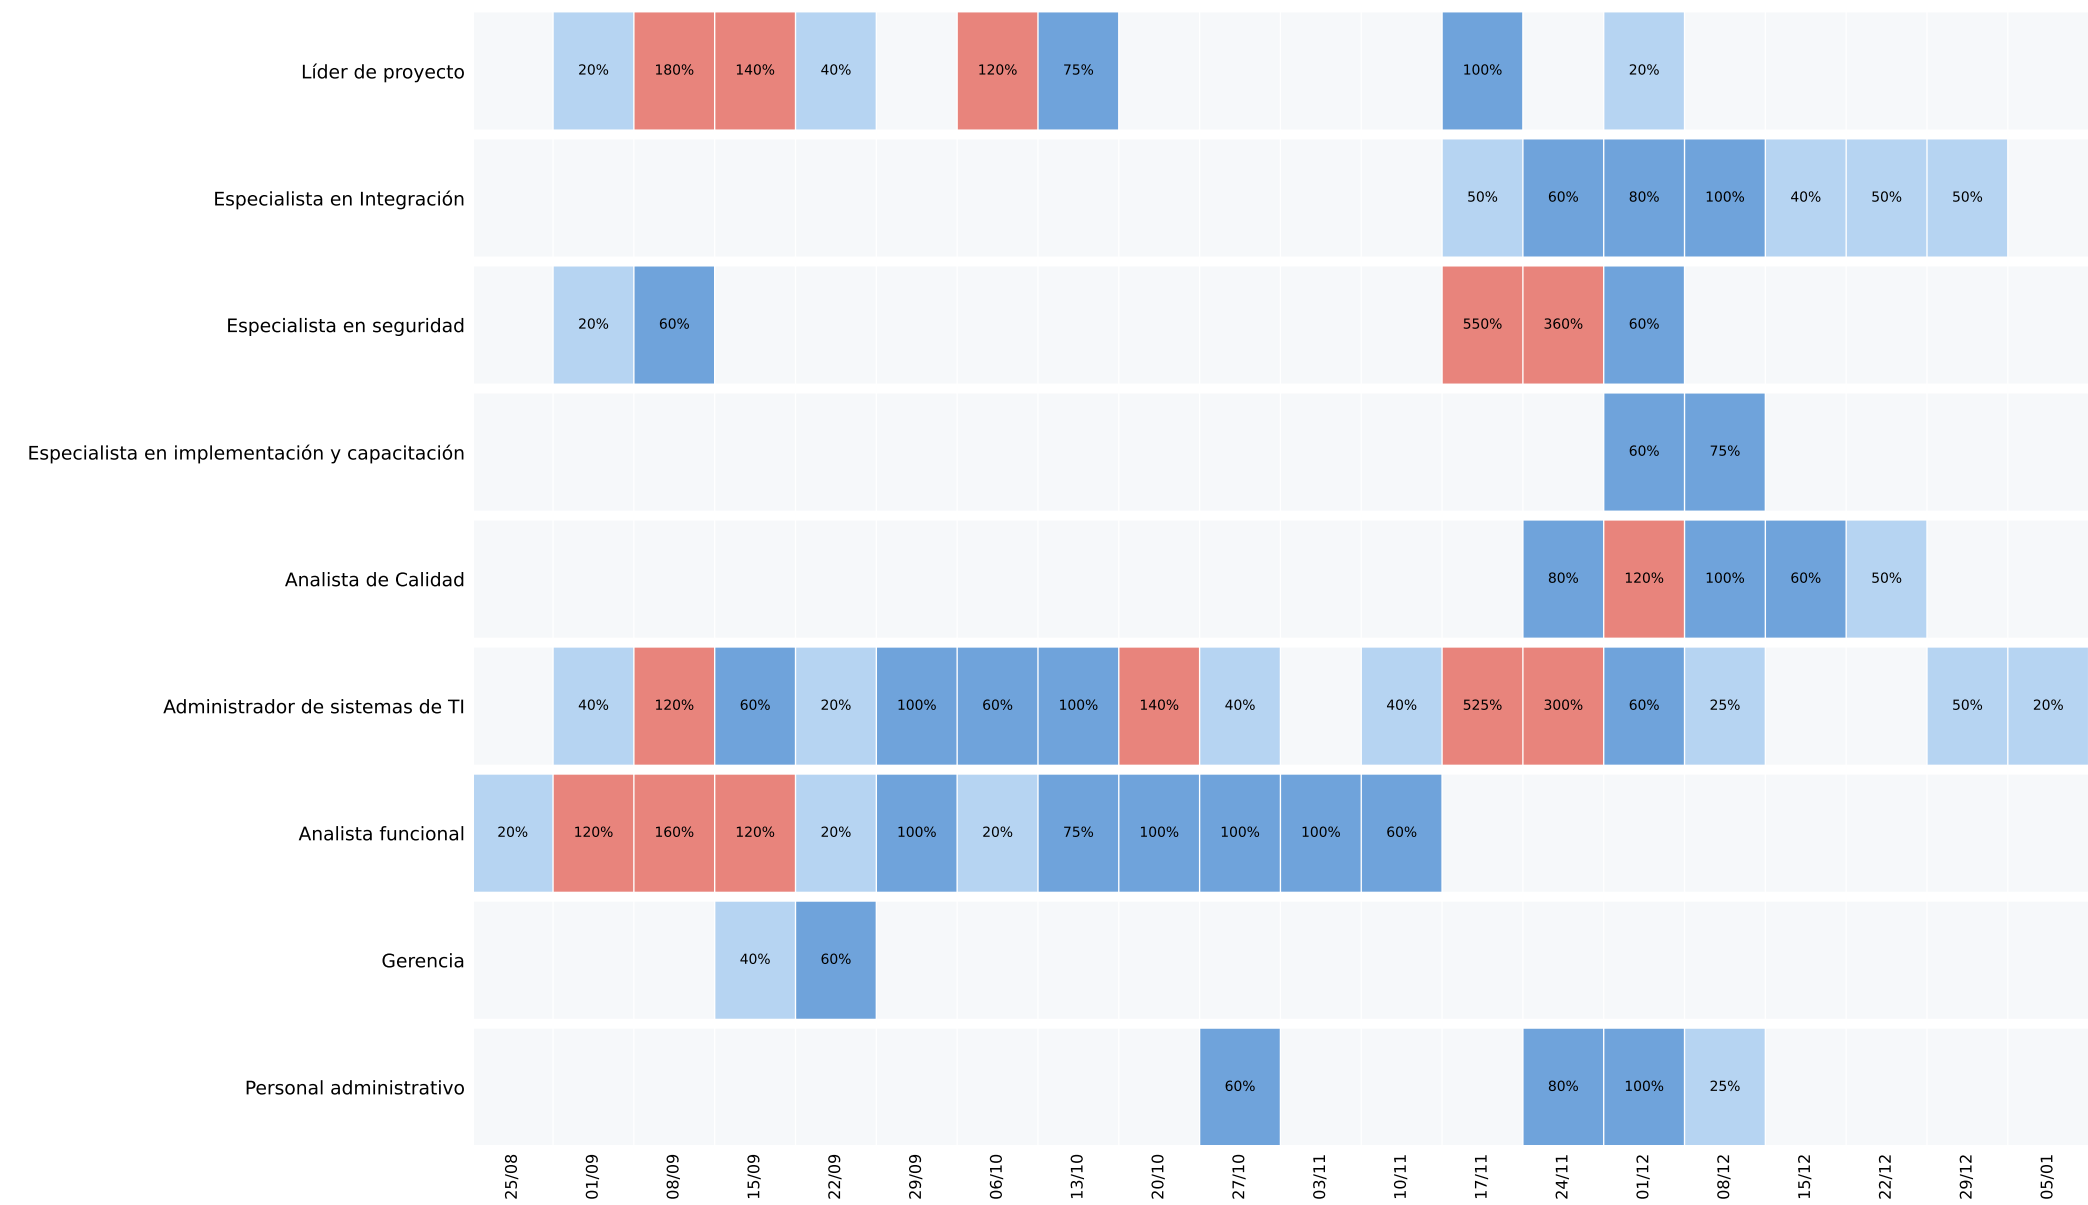

Carga = días-tarea asignados en la semana / días hábiles de la semana. En rojo, semanas con más del 100% de carga.
